

**Отчет о выполнении муниципальной программы  
городского округа Архангельской области "Котлас"  
"Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры  
городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы"  
за II квартал 2021 года.**

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии со стратегией социально-экономического развития городского округа Архангельской области «Котлас» на период до 2030 года, одобренной решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16 сентября 2010 года № 141-281-р; генеральным планом города Котласа.

Основной целью Программы является обеспечение незастроенных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства; обеспечение развития социальной инфраструктуры.

Общий объем финансирования по программе **на 2021 год** составляет –95 385,6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 503,2 тыс. рублей,  
средства областного бюджета – 85 191,7 тыс. рублей,  
средства местного бюджета – 9 690,7 тыс. рублей

Исполнение мероприятий программы за отчетный период:

**По пункту 1.2.2.**

*«Проектирование и строительство канализационной насосной станции в Южном районе г. Котлас»* оплачено **555,9 тыс.** рублей.

Заключен муниципальный контракт №29/2020 от 15 июля 2020 года ООО «НордГео» на выполнение работ по инженерным изысканиям, оплачено 371,7 тыс. руб.

Также заключен муниципальный контракт № 30/2020 от 17 августа 2020 года ООО «Проектно-сметное бюро «Агропромдорстрой»» на выполнение работ по проектированию объекта, кассовые расходы не производились.

Заключен муниципальный контракт №31/2020 от 25 августа 2020 года ООО «Бюро судебно-строительной экспертизы» на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в проекты межевания территории, кассовые расходы не производились.

Заклучен контракт № 0264-20 от 28 октября 2020 года ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» на оказание услуги по достоверности инженерных изысканий, оплачено 139,0 тыс. руб.



Получено положительное заключение экспертизы ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» №29-1-1-001791-2021 от 20 января 2021 года результатов инженерных изысканий.

Заключен контракт № 0063-21 от 26 марта 2021 года ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» на оказание услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, оплачено 45,2 тыс. руб.

#### **По пункту 2.1.**

*«Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м)»* оплачено **267,5 тыс.** рублей.

Заключен муниципальный контракт №3/2021 от 12 февраля 2021 года ООО «Сметное дело» на выполнение работ по приведению сметной документации в текущий уровень цен, оплачено 117,47 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0058-21 от 26 марта 2021 года ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» на оказание услуги по проведению повторной государственной экспертизы, оплачено 150,02 тыс. рублей.

Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы (сметная документация) №29-1-1-2-022401-2021 от 30 апреля 2021 года.

#### **По пункту 2.2.1.**

*«Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас-Коряжма, км 0-км 41»* оплачено **5 481,4** тыс. рублей.

Заключен МК №100/2019 от 31.12.2019 с ООО «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ».

На конец II квартала 2021 года выполнены следующие работы: расчистка площадей от кустарников и мелкокося, разработка грунта с погрузкой и перевозкой на автомобилях-самосвалах, планировка площадей бульдозерами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка и щебня – 63%, устройство ливневой канализации – 100%, устройство бортовых камней – 50 %, линия наружного электроснабжения 2 этапа – 50 %.

Выполнены работы по переустройству газораспределительных сетей и перекладке сети напорной канализации.

#### **По пункту 2.5.**

*«Строительство парковки для гостевого автотранспорта по ул. Кедрова, д. 14»*

Кассовые расходы не производились.



### По пункту 3.1.3.

*«Проект планировки территории и проект межевания части 12 квартала Южного района».*

Кассовые расходы не производились.

### По пункту 3.3.1.

*«Проектирование и строительство школы на 860 мест в г. Котласе»*  
оплачено **69 872,5** тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт № 68/2019 от 15 ноября 2019 года на выполнение работ по корректировке проектной документации ООО «ДОМОСТРОЙ» оплачено 209,6 тыс. руб.

Заклучен муниципальный контракт № 38/2020 от 28 октября 2020 года на оказание услуги по осуществлению авторского надзора за строительством школы на 860 мест в г. Котласе с ООО «Кедр» оплачено 20,85 тыс. руб.

Заклучен муниципальный контракт № 1/2021 от 25 января 2021 года на выполнение работ по корректировке проектной документации ООО «ДОМОСТРОЙ» оплачено 169,68 тыс. руб.

Заклучен контракт с ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» на оказание услуги по проведению повторной государственной экспертизы № 0020-21 от 11 февраля 2021 года, оплачено 178,27 тыс. руб.

Заклучен муниципальный контракт № 7/2021 от 09 апреля 2021 года на оказание услуги по осуществлению авторского надзора за строительством школы на 860 мест в г. Котласе с ООО «Кедр» оплачено 136,32 тыс. руб.

Заклучен муниципальный контракт № 10/2021 от 11 июня 2021 года на выполнение работ по корректировке проектной документации ООО «ДОМОСТРОЙ» оплачено 81,9 тыс. руб.

По муниципальному контракту №19/2019 от 01.09.2019 года на осуществление строительного контроля ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» кассовые расходы не производились.

Заклучен муниципальный контракт № 10/2019 от 20.05.2019 на выполнение работ по строительству школы на 860 мест в г. Котласе с ООО «ОРТОСТ-ФАСАД», ведется строительство объекта. Оплачено работ на 69 075,98 тыс.руб.

На конец II квартала 2021 года выполнены общестроительные работы ниже отметки 0,000: забивка свай – 100%, срубка оголовков свай – 100%, устройство подготовки из бетона – 100%, монтаж фундаментных блоков – 100%, монтаж плит перекрытия на отметке – 3,100 – 100%, - 0,500 – 100%, + 3,600 – 100%, +7,500 – 100%, + 11,400 – 100%. Кирпичная кладка выше отметки – 0,500 – 100%. Устройство перегородок – 100%, устройство кровли – 99%, электромонтажные работы – 91%, устройство ГВС, ХВС, отопление и канализация – 77%. Начаты работы по штукатурке стен – 98%, монтаж оконных блоков – 99%, устройство футбольного поля и спортивных площадок – 42%, устройство полов – 79%, устройство пристенного дренажа и хоз. фекальной канализации – 99%, монтаж вентиляционных систем – 70%,



устройство наружного освещения – 30%, перенос линии 10кВА – 100%, прокладка теплотрассы – 100%, изготовление секций ограждения – 57%, монтаж сэндвич панелей покрытия – 100%, отделочные работы – 48%, монтаж фасада – 75%, благоустройство территории – 15%.

Выполнено строительство ливневой канализации К2 диаметром 285 (субподрядная организация ООО «Компания АкваТех») – 100%, устройство водопровода В1 диаметром 285 мм (субподрядная организация ООО «Компания АкваТех») – 100%, устройство водопровода В1 диаметром 110 мм (субподрядная организация ООО «Компания АкваТех») – 95%.

#### **По пункту 3.3.4.**

*«Проектирование и строительство здания МДОУ на 220 мест по ул. Кедрова д.19 в г. Котласе»* оплачено **953,3** тыс. рублей.


Заключен муниципальный контракт от 31.05.2019 № 14/2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 220 мест в г. Котласе по ул. Кедрова, д. 19» с ООО «БЕЛЫЙ ДОМ». Объект введен в эксплуатацию 24 декабря 2020 года.

#### **По пункту 3.5.1**

*«Проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе»* кассовые расходы не производились.

Произведен авансовый платеж по уплате земельного налога – 31,8 тыс. руб.

Начальник Управления  
экономического развития  
администрации городского  
округа Архангельской области  
«Котлас»

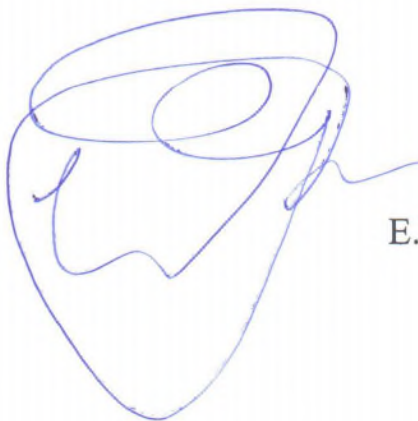

Е.В. Деньгин

Отчет о выполнении муниципальной программы городского округа Архангельской области "Котлас"  
"Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2025 годы",  
утвержденной постановлением администрации МО "Котлас" от 30.09.2019 № 1819  
за II квартал 2021 года.

	Объемы финансирования														процент освоения финансовых средств			фактический результат выполнения
	бюджет городского округа "Котлас"				областной бюджет				федеральный бюджет									
	всего																	
№ п/п, наименование программ	предус-мотрено постанов-лением о програм-ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной росписью	кассовые расходы	предус-мотрено постанов-лением о програм-ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной росписью	кассовые расходы	предус-мотрено постанов-лением о програм-ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной росписью	кассовые расходы	сумма, от програм-ме	сумма от первоначального плана	сумма уточненного плана			
1.2. Проектирование и строительство канализационной насосной станции в Южном районе г. Котласа	1 566,8	0,0	1 566,8	555,9	1 566,8	1 566,8	555,9						35,48	0,00	35,48			
2.1. Проектирование и строительство автодорог по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Писаревская, (протяженность 1900 м.)	537,1	0,0	11 278,4	267,5	537,1	537,1	267,5	0,0		10 741,3			49,80	0,00	2,37			
2.2.1. Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объединенной автомобильной дороги «Котлас-Котляжма, км 0-км 41».	8 943,7	2 915,0	8 943,7	5 481,4	3 510,5	2 915,0	3 510,5	274,1	5 433,2	5 207,4			61,29	188,04	61,29			
2.5. Строительство парковки для гостевого автодваспорта по ул. Карова, д. 14	1 331,0	0,0	1 331,0	0,0	1 331,0	1 331,0	0,0						0,00	0,00	0,00			
3.1.1. Проект планировки территории и проект межевания территории восточной части рабочего поселка Вычегодский	300,0	250,0	300,0	0,0	300,0	250,0	300,0	0,0					0,00	0,00	0,00			



Объемы финансирования																
№ п/п, наименование программы	место			бюджет городского округа "Котлас"			областной бюджет			федеральный бюджет			процент освоения финансовых средств			фактически выполнено
	предусмотрено постановлением о програм-ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	предусмотрено постановлением о програм-ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	предусмотрено постановлением о програм-ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	предусмотрено постановлением о програм-ме (на год)	первоначальный план по бюджету (на год)	уточненный план по бюджету в соответствии с уточненной бюджетной росписью	от сумм, предусмотренной постановлением о програм-ме	от сумм первоначального плана по бюджету	от сумм уточненного плана	
3.1.4 Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка Восточного шоссе и автомобильной дороги Котлас-Коржак, км 0- км 41)	150,0		150,0	0,0	150,0		0,0						0,00		0,00	
3.3.1. Проектирование и строительство школы на 860 мест в г. Котласе (***)	70 734,9	7 481,9	70 734,9	69 872,5	1 728,0	1 076,7	1 728,0	865,6	69 006,9	6 405,2	69 006,9	69 006,9	98,78	933,89	98,78	
3.3.1.1 Земельный налог	127,3	0,0	127,3	31,8	127,3		127,3	31,8					24,98		24,98	
3.3.3. Проектирование и строительство здания МДОУ на 220 мест по ул. Кедрова д.19 в г.Котласе	953,5	0,0	953,5	953,3	440,0		440,0	439,8	10,3		10,3	503,2	99,98		99,98	
3.5.1 Проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0									
Итого по программе	84 644,3	10 646,9	95 385,6	77 162,5	9 690,7	4 241,7	9 690,7	2 434,7	74 450,4	6 405,2	85 191,7	74 224,5	503,2	0,0	503,2	

Исполнитель: ведущий специалист Отдела экономики и муниципальных программ Управления экономического развития администрации городского округа "Котлас"

В.В. Стецюк

Начальник Управления экономического развития администрации городского округа "Котлас"

Е.В. Демьян

5-17-11

Согласовано в части бюджетного финансирования.  
Главный специалист-главный бухгалтер Управления  
2-75-02

Е.Л. Нарбекова
